

## Informe mensual I.E. Simón Bolívar - Sede Principal Distrito Especial de Buenaventura dentro del mes de abril de 2024

El presente informe es publicado en cumplimiento de lo ordenado en la Sentencia número T-547 del 6 de diciembre de 2023 proferida por la Sala Novena de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en el marco del proceso de revisión de los fallos proferidos el 6 de febrero de 2023 por el Juzgado Primero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Buenaventura - Expediente T-9.384.835, y el cual se hace en los siguientes términos:

### 1. ACTIVIDADES Y AVANCE OBRA AMPLIACIÓN

Es de señalar que el contrato a la fecha cuenta con un avance ejecutado del 16.13 %. Sin embargo, frente a la construcción de la ampliación, se inició su ejecución el 10 de abril de 2023, el cual al corte de fecha 20 de febrero al 20 de abril de 2024, se cuenta con un avance de obra del 11.52% y, en consecuencia, se han realizado las siguientes actividades:

#### 1.2. Preliminares, localización y replanteo

	
Comisión topográfica - Localización y replanteo	Comisión topográfica - Localización y replanteo

	
Limpieza y descapote	Limpieza y descapote

### 1.3. Demoliciones y desmontes

	
Demolición de losa – área de cancha.	Demolición de gradería en concreto





Demolición de muro en ladrillo tolete área de gradería



Demolición de losa en concreto – área de cancha

#### 1.4. Retiro de postes



Retiro de 11 postes ubicados en área de intervención



Retiro de 11 postes ubicados en área de intervención



Retiro de 11 postes ubicados en área de intervención



Retiro de 11 postes ubicados en área de intervención

### 1.5. Excavaciones



Excavaciones cimentación (zapatas)



Excavaciones cimentación (zapatas)





Excavaciones cimentación (vigas y zapatas)



Excavaciones en zapata

### 1.6. Cimentación y armado de refuerzo



Armado de acero para zapatas



Armado de acero para vigas de cimentación



Fundición de zapatas y vigas según diseño	Formaleta para estructura de cimentación

En ese orden, es de indicar que, el avance de la obra se afectó por causas atribuibles a las autorizaciones para el traslado de postes eléctricos, dificultades de orden público, factores climáticos y la interferencia con una tubería de oleoducto que pasaba en el predio y que impidió hasta el 10 de enero de 2024 las excavaciones para la cimentación de los bloques.

Asimismo, frente a esta última consideración, desde el mes de julio de 2023 se realizaron consultas sobre el estado y propiedad de la tubería a Ecopetrol, cenit y ETC.

Finalmente, el 10 de enero de 2024 la ETC autorizó el corte y sellado de la tubería, actividad que permitió la continuidad de los frentes de obra, por lo cual deberá ser restablecido el tiempo de afectación que se tuvo en la ejecución del contrato con una prórroga.

## **2. Actividades y avance mejoramiento integral**

De igual manera, las actividades del mejoramiento integral iniciaron el 07 de septiembre de 2023, con la suscripción del acta de entrega del bloque A por parte del Rector y ETC, contratistas y UG FFIE. A la fecha de corte se cuenta con un avance 57.70% en las siguientes actividades:

- Cambio de cubierta incluye suministro e instalación de estructura metálica
- Retiro de cielo falso e instalación nuevo
- Demolición y repello de culatas, pero en visitas posteriores se evidenciaron otras necesidades como adecuación completa de baños, adecuación de paredes, la mayoría en muy mal estado por la humedad, pintura interna y externa, resanes donde hubiera lugar, ajuste de escaleras,
- Demoliciones parciales de cielo raso y desmontes

### **2.1. Registro fotográfico actualizado área de mejoramiento infraestructura existente**

<b>CUBIERTA</b>
-----------------



	
Instalación de láminas UPVC mantenimiento de vigas- mantenimiento de muro de paredes	Instalación de cubierta- mantenimiento externo a tanque de recolección de agua potable
	
Cambio cubierto, mantenimiento de vigas aéreas, vigas de amarres, mantenimiento de ventanería	Instalación de tubería MT . Proyección de puntos de luminarias.

### REPARACION DE MUROS, REPELLOS Y CERRAMIENTO



Desmante de luminarias, mantenimiento de paredes y cielos.



A Desmante de luminarias, mantenimiento de paredes y cielos.

### MANTENIMIENTO DE BATERIAS SANITARIAS



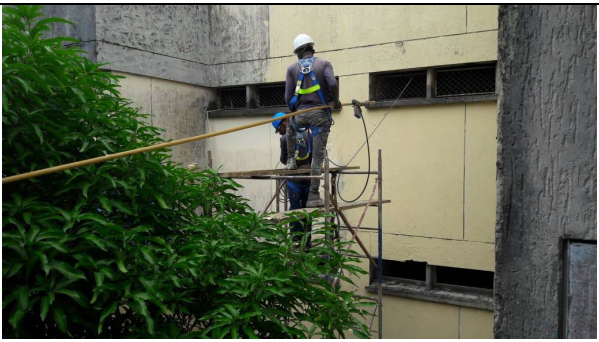

Instalación de enchape baterías sanitarias niños - niñas



Fundición de mesón en granito pulido

### MANTENIMIENTO DE FACHADAS



	
Mantenimiento en área de fachada	Pintura en área de fachada

### 3. Mesas de trabajo desarrolladas con la Comunidad Educativa

Es dable para conocimiento de la Honorable Corte Constitucional, a través de la Sala Novena de Revisión, del Juzgado Primero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Buenaventura, como de la comunidad educativa y, en general, que a las fecha se han venido realizando las respectivas mesas de trabajo conforme a lo ordenado y, el cual se relacionan a continuación:

- 10 de abril 2023 – Socialización de inicio de actividades de inicio de obra.
- 07 de noviembre del 2023 - mesa de trabajo con el acompañamiento de rector de la institución, Contratista de obra – Contratista de interventoría- FFIE
- 15 de noviembre de 2023\_ mesa de trabajo con el acompañamiento de rector de la institución, Contratista de obra – Contratista de interventoría- FFIE
- 10 de enero del 2024 – recorrido técnico acompañado por parte de la ETC de Buenaventura- contratista de obra – contratista de interventoría – FFIE.
- 02 de febrero del 2024 – reunión con padres de familia, cuerpo docente de la institución educativa y contratista de obra e interventoría
- 26 de febrero del 2024 – reunión con padres de familia, cuerpo docente de la institución educativa y contratista de obra e interventoría.
- 04 de marzo del 2024 - Cumplimiento Atención a sentencia 547 de 2023
- 02 de abril del 2024 - Presentación de avances IE área de mejoramiento, presentación de estrategia de entrega
- 04 de abril del 2024 - Reunión extraordinaria y presentación de avances IE área de mejoramiento, presentación de estrategia de entrega
- 08 de abril del 2024 - Seguimiento a compromisos establecidos en la mesa de trabajo del 04 de abril del 2024

### 4. SOCIALIZACIONES

Por otro lado, el pasado 8 de abril de los corrientes, conforme a la conversación telefónica que se sostuvo con la señora Juez Primero (01) de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Buenaventura, la ingeniera

Dadiana Folleco, Coordinadora de la Región Pacífico de la Dirección Técnica de la Unidad de Gestión del FFIE (UG FFIE) y el señor director Jurídico de la UG FFIE, así como del señor Rector de la Institución Educativa San Simón y de representantes de la comunidad educativa, se solicitó información acerca de avances en la ejecución de las obras en dicha institución en el marco de los diferentes compromisos a cargo del FFIE ordenados por la Honorable Corte Constitucional en la Sentencia 547 de 2023, el cual, en el desarrollo de esa conversación, como de lo remitido en oficio No. FIE2024EE005326 del 11/04/24 – que se adjunta -, se mencionó lo siguiente:

Que en mesa de seguimiento el 04 de abril de 2024 con asistencia del Gestor Territorial de la Unidad de Gestión del FFIE y representantes de la Comunidad Educativa, se había señalado que el Contratista se comprometió a entregar el 30 de abril de 2024, habilitación de espacios del mejoramiento del bloque A, que es aquella parte de la IE que está siendo intervenida para su mejoramiento conforme el alcance contemplado en el Contrato No. 1380-1357-2020 suscrito con la Unión Temporal Corvez.

Adicionalmente, se explicó que por el deficiente estado de la infraestructura había sido obligatorio aumentar el alcance de la intervención, dado que inicialmente la inversión del mejoramiento estaba prevista en la suma de CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS MLCTE (\$400.000.000) y, a la fecha de acuerdo con el último balance presupuestal se estima en MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESOS MLCTE (\$1.700.000.000).

De igual forma, se tiene prevista una intervención de más del 400 por ciento del valor estimado inicialmente, lo anterior, para cumplir con los compromisos realizados con la entidad territorial y la mesa de Paro Cívico para lograr el mejoramiento integral de la sede, lo cual redundará en un mayor plazo de ejecución.

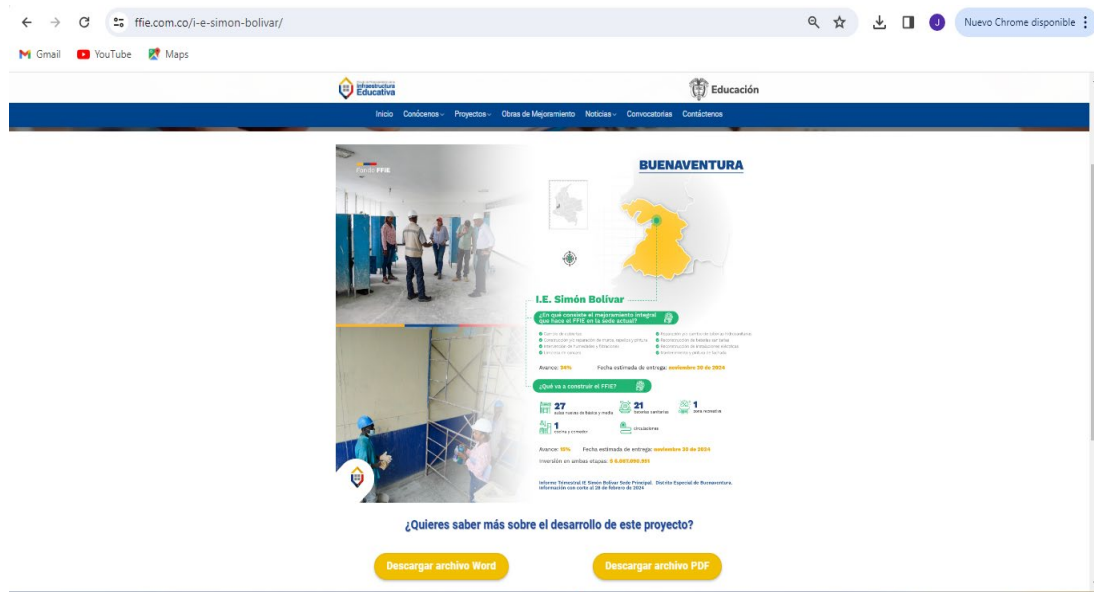
No obstante, de acuerdo con el compromiso adquirido con la comunidad en la mencionada mesa de seguimiento, la fecha de habilitación de espacios del mejoramiento del bloque A, prevista para el 30 de abril de 2024, como está indicado en la comunicación remitida por la interventoría con radicado No. 2024-COP-B\FIE2024EE005326 VTURA-357-039 del 09 de abril de 2024, el cual se adjunta al presente oficio junto con el anexo correspondiente que contiene el compromiso del contratista de obra, serán habilitados los siguientes espacios de este bloque:

- 11 Aulas,
- 1 Sala de profesores.
- 2 Coordinaciones.
- 1 Batería de baños.
- Escaleras.
- Pasillos.

Con ocasión a lo anterior, el presente informe se encuentra enlazada desde el botón directo en la página principal y, el cual se encuentra publicado en el siguiente link para su descarga en formato Word y PDF para los fines de consulta: <https://ffie.com.co/i-e-simon-bolivar/>

Ver pantallazo adjunto de publicación WEB.





**BUENAVENTURA**

**I.E. Simón Bolívar**

**¿Qué tan avanzado está el desarrollo del proyecto?**

**90%** **Fecha estimada de entrega: noviembre 20 de 2024**

**¿Qué va a construir el FFIE?**

Actividad	Progreso	Fecha estimada de entrega
27	100%	noviembre 20 de 2024
21	100%	noviembre 20 de 2024
1	100%	noviembre 20 de 2024

**¿Quieres saber más sobre el desarrollo de este proyecto?**

[Descargar archivo Word](#) [Descargar archivo PDF](#)
