

**Informe Trimestral IE Simón Bolívar Sede Principal**  
**Distrito Especial de Buenaventura**  
**23 de septiembre de 2024**

En la Institución Educativa Simón Bolívar en su sede principal, el Ministerio de Educación Nacional a través del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa FFIE realiza una intervención que contempla la construcción de: 12 aulas nuevas de básica media, 1 comedor, 1 cocina, 1 zona recreativa, 21 baterías sanitarias y circulaciones. Adicional a la obra de ampliación, se realiza una intervención de mejoramiento integral a los tres bloques del colegio existente ejecutando las siguientes actividades:

1. Cambio de estructura y teja de cubierta
2. Construcción y/o reparación de muros, repellos, estuco y pintura
3. Reparación de humedades y filtraciones
4. Limpieza de canales
5. Reparación y/o cambio de tuberías hidrosanitarias
6. Reconstrucción baterías sanitarias
7. Reconstrucción instalaciones eléctricas
8. Mantenimiento y pintura de fachada.

Estas actividades se realizan a través del Contrato de obra 1380-1357-2020 a cargo del contratista Unión Temporal Corvez (cesión contratista Miroal S.A.S) y es supervisado por la interventoría Consorcio Cinco Opciona. Este contrato inició con la fase de estudios y diseños de la obra de ampliación, así como, la gestión de la licencia de construcción y sus permisos. Posterior a ello, se continuo con la etapa de obra, que inicio el 13 de abril de 2023. A continuación, se presenta la trazabilidad de las condiciones del contrato desde su inicio a la fecha.

<b>Contrato de obra 1380-1357-2020.</b>	
Objeto	i) Pre-construcción, ii) Construcción y iii) Post-construcción para la ampliación y mejoramiento de la Institución Educativa SIMÓN BOLIVAR, SEDE PRINCIPAL.
Valor inicial del contrato	\$ 10.283.913.281

Fecha de suscripción contrato de obra	14 de enero de 2021
Plazo inicial del contrato	14 meses
Fecha de inicio Fase 1	19 de febrero de 2021
Fecha de Socialización Fase 1	02 de octubre de 2017
Suspensión No .01	17 de junio de 2021 a 30 de julio de 2021. Coordinación de la socialización del diseño con la ETC Buenaventura, mesa del Paro Cívico y comunidad educativa
Suspensión No. 02	12 de agosto de 2021 a 11 de octubre de 2021. Solicitud de ajuste a la ETC del área de predio en documentos de titularidad.
Prórroga No 01 del plazo del contrato	75 días calendario, Plazo necesario para incorporar al diseño las solicitudes de la comunidad y mesa de paro
Suspensión No. 03	24 de diciembre de 2021 a 24 de enero de 2022. Se suspende por los plazos para realizar los trámites de licencia de construcción en la curaduría
Suspensión No. 04	08 de abril de 2022 a 06 de junio de 2022 Trámites y respuesta de la empresa de servicios públicos SAAB conexiones acueducto y alcantarillado
Suspensión No. 05	14 de junio de 2022 a 22 de septiembre de 2022 solicitud de aprobación diseños eléctrico por el operador Celsia
Suspensión No. 06	11 de octubre de 2022 a 09 de enero de 2023. Solicitud permiso intervención espacio público en Planeación para continuar trámite en Celsia
Fecha Inicio Fase 2 Obra	10 de abril 2023

Prórroga No 01	6 meses 15 días. Plazo de acuerdo con cronograma de obra, ampliación a causa de afectación al proceso constructivo por situaciones encontradas en fase demolición, retiro de postes eléctricos, orden público, factores climáticos
Prórroga No 02	5 meses 19 días afectaciones por tubería oleoducto que restringe el avance obra entre 30 de junio de 2023 a 29 de noviembre de 2023.
Suspensión 7	26 de marzo de 2024 a 31 de marzo del 2024. – cancelación de suministro por parte de proveedores por festividades de semana Santa.
Terminación contractual	26 de noviembre de 2024
Prórroga 03 y adición	Ampliación y adición de plazo por mayores cantidades de obra.
Fecha programada de entrega	31 de marzo de 2024

### Actividades y avance obra ampliación

El contrato cuenta con una ejecutado del 45.62 % que corresponde a un avance del **53%** en el mejoramiento integral de la infraestructura existente y un **28%** de ejecución en la obra de ampliación como se detalla a continuación:

- i) Del mejoramiento integral se informa que el 10 de mayo de 2024 fue entregado el bloque A y desde esa fecha se encuentra en uso por parte de la comunidad educativa. Se relaciona registro fotográfico del antes y después de las adecuaciones así:

### Mejoramiento Bloque A:




Estado inicial de aulas



Adecuación aulas existentes bloque A



Estado inicial de aulas

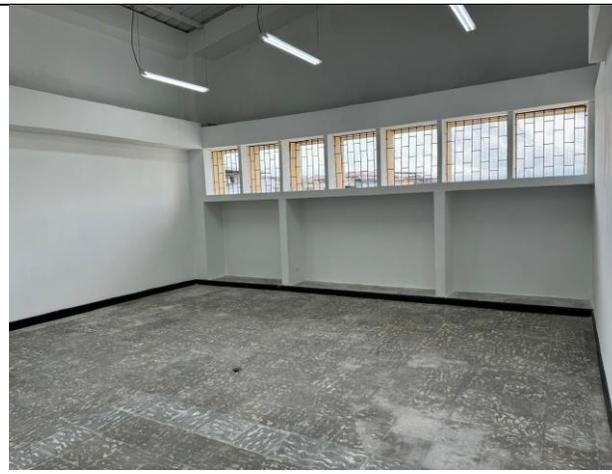

Adecuación aulas existentes bloque A



Estado inicial fachada



Adecuación fachada existente bloque A



Estado inicial fachada



Adecuación fachada existente bloque A



Estado inicial fachadas



Adecuación baños existentes bloque A

De otra parte, se avanza en el mejoramiento de los bloques B y C de la infraestructura existente con la restauración de la fachada, enchape de baños e instalación de puertas y marcos

### Mejoramiento Bloques B y C



Restauración de fachada



Instalación de marcos y puertas aulas



Enchape de muros (baños)



Enchape de muros (baños)



Pintura de muros interiores



Pintura muros exteriores

- ii) En la obra de ampliación fue ejecutada la estructura de primer piso de los bloques de comedor y aulas, así mismo se fundió el 90% de la placa de entrepiso del bloque de aulas y se avanza en el armado de las vigas aéreas del bloque de comedor.

De otra parte, se informa que en el área de ampliación, se tiene un cerramiento existente que amenaza ruina y por consiguiente se ha hecho un ajuste del diseño estructural del nuevo cerramiento que será construido, con un mayor alcance al previsto inicialmente y en consecuencia será ampliado el plazo del contrato para su construcción, teniendo como fecha estimada de entrega del proyecto el mes de marzo de 2025.

**Obra de ampliación:**

 <p>9 sept 2024 2:10:23 p. m.              8-72 Carrera 61              Buenaventura              Valle del Cauca</p>	 <p>13 sept 2024 2:45:42 p. m.              4-58 Carrera 61              Buenaventura              Valle del Cauca</p>
<p>Armado placa de entrepiso bloque de aulas</p>	<p>Armado vigas aéreas bloque de comedor</p>



Fundida de concreto placa de entrepiso  
bloque de aulas



Fundida de concreto placa de entrepiso  
bloque de aulas



Armado vigas aéreas bloque de comedor

### Mesas de trabajo desarrolladas con la Comunidad Educativa:

- 10 de abril 2023 – Socialización de inicio de actividades de inicio de obra.

- 07 de noviembre del 2023 - mesa de trabajo con el acompañamiento de rector de la institución, Contratista de obra – Contratista de interventoría- FFIE
- 15 de noviembre de 2023\_ mesa de trabajo con el acompañamiento de rector de la institución, Contratista de obra – Contratista de interventoría- FFIE
- 10 de enero del 2024 – recorrido técnico acompañado por parte de la ETC de Buenaventura- contratista de obra – contratista de interventoría – FFIE.
- 02 de febrero del 2024 – reunión con padres de familia, cuerpo docente de la institución educativa y contratista de obra e interventoría
- 26 de febrero del 2024 – reunión con padres de familia, cuerpo docente de la institución educativa y contratista de obra e interventoría.
- 04 de marzo del 2024 - Cumplimiento Atención a sentencia 547 de 2023
- 02 de abril del 2024 - Presentación de avances IE área de mejoramiento, presentación de estrategia de entrega
- 04 de abril del 2024 - Reunión extraordinaria y presentación de avances IE área de mejoramiento, presentación de estrategia de entrega
- 08 de abril del 2024 - Seguimiento a compromisos establecidos en la mesa de trabajo del 04 de abril del 2024
- 10 de mayo de 2024 – Entrega del mejoramiento del Bloque A
- 11 de septiembre de 2024 – Socialización de los avances con la comunidad educativa.

### **Gestiones internas UG FFIE:**

De otra parte, en cumplimiento del plan de mejora requerido en el marco de la Sentencia 547 de 2023, se han realizado mesas de trabajo internas con las direcciones de la UG FFIE, fue tramitada la modificación del contrato de obra, donde fueron adicionados los recursos de las mayores cantidades de obra y fue ampliado el plazo de ejecución hasta el mes de noviembre de 2024. Así mismo fue asignado el contrato de interventoría al Consorcio JEL quien realiza el seguimiento desde el mes de septiembre de 2024.

Bogotá, D.C., 30 de septiembre de 2024



FFIE2024EE0T6098

Señores

**JUZGADO PRIMERO (01) DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE BUENAVENTURA**

RAMA JUDICIAL

j01pccmbuenaventura@cendoj.ramajudicial.gov.co

Buenaventura, Valle Del Cauca

Asunto: Cumplimiento a Sentencia T-547 DE 2023. Informe Trimestral.

Cordial saludo;

En atención a lo ordenado por la Sala 9 de Revisión de Tutelas de la Honorable Corte Constitucional, me permito mediante el presente, con ocasión a los cumplimientos y compromisos trazados en virtud de la Sentencia 547 de 2023, en lo que concierne al **Informe Trimestral** a fecha 23/09/24, con relación a la IE - Simón Bolívar, Sede Principal del Distrito de Buenaventura, y el cual se acompaña en anexo a esta respuesta, de conformidad a lo remitido y relacionado por la Regional Pacífico de la UG FFIE, a través de su Coordinación, y en consecuencia, se hacen de conformidad de aquellos asuntos que atañen al Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), en nombre de la Nación - Ministerio de Educación Nacional (MEN).

Me suscribo con el reiterado respeto.

Del señor (a) Juez,

Atentamente,

**JAIME ALEJANDRO DURAN FONTANILLA**

Director

DIRECCIÓN JURÍDICA

Proyectó: JORGE MARIO PEREZ SOLANO  
Revisó: JAIME ALEJANDRO DURAN FONTANILLA

Anexos: request.pdf
